

今後の取組について

日田市林業振興課

令和7年3月21日

森林経営管理制度等の進め方について

未整備森林解消のための森林整備

【資源解析:基礎資料】林業経営に適する・適さない森林を判断するためのゾーニングや意向調査対象林班として、森林整備の優先順位付け

未整備森林
対象箇所
(森林経営計画含む)

- ①森林資源解析結果を活用して未整備森林を抽出
- ②整備の優先される林班から未整備森林区域を日田市森林整備計画に定める。
(→R元～R4:13林班 R5:高瀬1, 前津江4林班)

現地調査及び
意向調査の実施

- ③未整備森林(現地)調査の実施 ※R4までは林班内の全筆調査を実施
(→R元～R4:13林班、R6:高瀬1, 前津江1林班実施、R7:前津江2林班予定)
- ④意向調査実施 R2～R5実績:未整備森林13林班(621ha)中、約114ha(152筆:所有者96人)に実施
(森林経営計画外) R6実績:高瀬、前津江の2林班(89ha)中、約49ha(15筆:所有者12人)に実施
R7予定:前津江2林班 + 上津江町全体(84林班分)

森林区分
(ゾーニング活用)

⑤木材等生産機能を重視する森林(生産林)

⑥公益的機能を重視する森林(環境林)

所有者管理への支援
(補助金型)

路網整備(譲与税事業)
実施主体:林業事業体

市に経営管
理権を設定

⑨隣接する
森林経営計
画への参画
をあっせん

市に経営管理権を設定/協定締結

⑦林業専用道整備(林専道開設)

- ・国助成が32～38千円/mに変更され、大分県林業専用道整備事業への市上乗せ補助(+15千円/m)
- ・10トトラック・全幅員(路肩含)4m

登録林業経営
体に再委託
(検討中)

造林補助(市
上乗せ補助)

⑩市が自ら管理(業務委託想定)
→市町村森林経営管理事業(譲与税事業)

⑧基幹作業道整備(既設森林作業道の格上げ)

- ・既設作業道の機能強化(路面、法面部分補強)
- ・待避所設置・小型(2～4ト)トラック
- ・全幅員(路肩含)3～4m
- ・開設30千円/m、改良15千円/m

⑪溪流沿い・尾根急傾斜地
→災害に強い森林づくり(譲与税)

大分県災害に強い森林づくり事業と協調し、河川・溪流沿いや尾根・急傾斜地(林業不適地)において、現状スギ・ヒノキを樹種転換し、広葉樹林化を目指す。

- (1) 短期間(5年)で公益的機能の向上など、一定の効果が得られる切捨間伐(搬出に向けた作業道も検討)
- (2) 急峻で林業経営に適さない森林(現状:スギ)は、路網整備又は架線集材により、広葉樹(早生樹)に樹種転換を誘導し、成林が見込める10年程度を市が管理。(国の主伐事例は15年)
- (3) 市管理期間の終了後は、再度、設定(更新)できるが、経営管理は森林所有者に戻る。

⑮国へ土地を手放す相続土地国庫帰属制度紹介

⑫九州電力危険木事前伐採

⑬森林経営計画カバー率8割を踏まえ、可能な限り隣接する森林経営計画への参画(取込)を斡旋



⑭市町村森林経営管理事業の再実施(更新)

未整備森林の設定について

未整備森林対象区域(林班)設定

意向調査 優先順位	林班	経営計画 順位	人工林率 順位	過密林 順位	路網密度 順位	施業 順位	備考
1	374	51	40	135	87	172	R6実施
2	233	259	90	47	15	143	R6実施
4	373	86	89	96	80	259	
8	376	50	270	271	204	1	R7予定
256	377	668	545	231	110	1	R7予定

赤色：経営計画なし、オレンジ色：5条森林以外

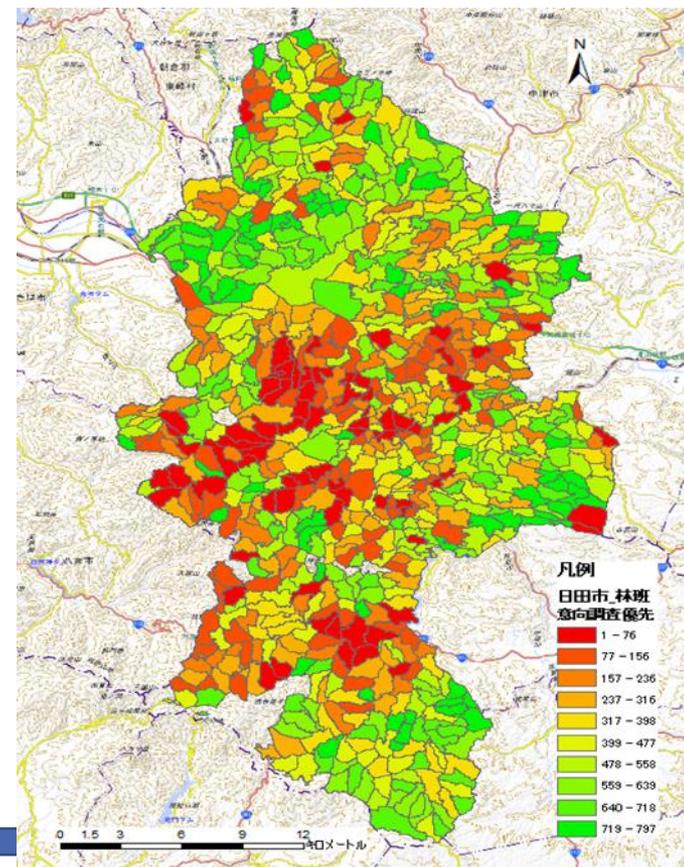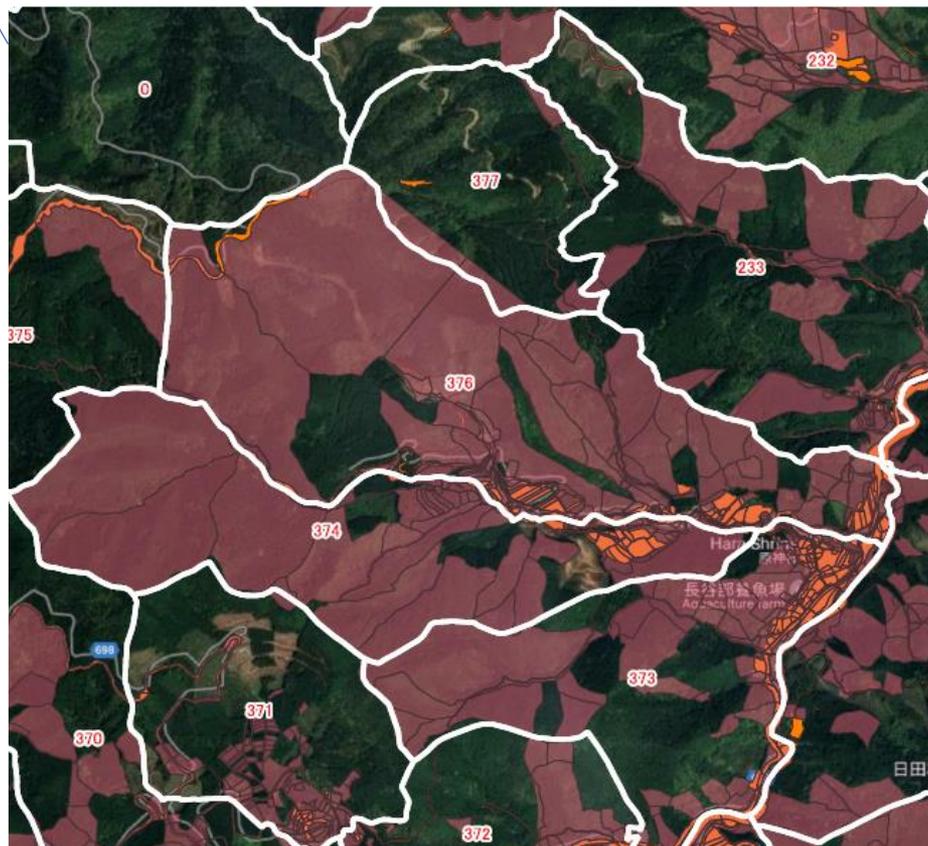

対象項目 優先度が高いと判断されるもの

路網密度	路網密度が低い林班
人工林率	人工林率が高い林班
過密率	スギ・ヒノキ人工林で相対幹距により混んでいると判断されるもの
施業実績	人工林率に対し施業実績が低い林班
森林経営計画策定率	林班内森林面積に対し、森林経営計画対象面積率が低いもの。

森林経営管理推進事業の進捗状況・計画について

▶ 森林経営管理推進事業のロードマップ

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
①	森林資源解析	市実施：市南部区域(約36千ha)資源解析	県実施：市北部(16千ha)	県の解析結果を活用し市北部区域(約16千ha)ゾーニング・優先順位等実施		(373, 374, 376, 377) (233)
②	未整備森林対象区域(林班)設定	高瀬2林班 (200, 221) 前津江3林班 (299, 300, 323) 大山3林班 (633, 634, 635)		小野1林班 天瀬2林班	(82) (673, 675)	中津江1林班 (399) 上津江1林班 (479) 高瀬1林班 前津江4林班
③	未整備森林(現地)調査の実施		高瀬2林班(R1:221, R2:220) 前津江3林班(R1:299, 323, R2:300) 大山3林班(633, 634, 635)	151.39ha 170.77ha 77.83ha	小野1林班 89.28ha 天瀬2林班 97.73ha	中津江1林班 25.90ha 上津江1林班 9.41ha
④	意向調査の実施		高瀬2林班(1人:1.39ha) 前津江3林班(42人:57.24ha) 大山3林班(25人:33.35ha)		小野1林班(2人:1.33ha) 天瀬2林班(8人:6.84ha)	中津江1林班(12人:11.61ha) 上津江1林班(6人:2.61ha)
⑤	生産林 森林路網整備補助事業の実施			高瀬検討 前津江検討 大山検討	小野(82林班) 路線(L=980m) 完了 前津江(299林班) 路線(L=1,140m)完了	中津江(399林班) 路網検討
⑥	(既存)森林経営計画への参画・造林補助実施			高瀬検討 大山検討		
⑦	環境林 市町村森林経営管理事業の実施		経営管理権検討		大山・前津江検討	
⑧	森林経営計画参画		前津江検討(大山R3.12月1件設定)		前津江(300林班) 1件(1.37ha)実施中(約5年間)	
						市町村森林経営管理事業(5年)完了後、経営計画へ参画

森林経営管理推進事業の進捗状況・計画について

▶ 森林経営管理推進事業のロードマップ

		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
①	森林資源解析					
②	未整備森林対象区域(林班)設定					
③	未整備森林(現地)調査の実施	高瀬1林班(233) 前津江1林班(374)	前津江2林班(376・374)	上津江全体(84林班分)		
④	意向調査の実施	高瀬1林班(233) 前津江1林班(374)	上津江全体(84林班分) 前津江2林班(376・374)			
⑤	生産林 森林路網整備補助事業の実施	中津江(399林班) 路網検討				
⑥	(既存)森林経営計画への参画・造林補助実施	大山・前津江検討				
⑦	環境林 市町村森林経営管理事業の実施	前津江(300林班) 1件(1.37ha)実施中(約5年間)		中津江(399林班) 協定19件(2.83ha) (約5年間)		
⑧	森林経営計画参画	市町村森林経営管理事業(5年)完了後、経営計画へ参画				
